



Engagés Solidaires
FONDATION D'ENTREPRISES



Bilou Toguna

PARTENARIAT

FONDATION ENGAGES SOLIDAIRES – ASSOCIATION BILOU TOGUNA

Bilan définitif des projets financés par la
Fondation en 2024
Fin des projets 2023

Rappel des projets prévus en 2024 :

En décembre 2023, la Fondation Engagés Solidaires a accordé à l'association Bilou Toguna une première subvention de **9 096 €** pour la réalisation des projets suivants au Mali :

	Budget prévisionnel accordé	Dépenses 2024- 2025
– Barrage sur le site de Namandon	5 096 €	5 465 €
– Puits d'eau domestique pour le village de Amani Djanogou	4 000 €	2 348 €

En juin 2024, le Fondation a accordé une subvention supplémentaire de **5 341 €** à l'association Bilou Toguna, pour la participation à la construction d'une salle de classe supplémentaire pour l'école de Sangha A. Postes de travaux financés : terrassement, fondation, soubassement et maçonnerie. L'association Bilou Toguna prend en charge sur ses fonds propres la part restante du financement de ce projet.

	Budget total du projet	Budget prévisionnel accordé	Dépenses 2024-2025
– Salle de classe Ecole Sangha A :	10 845 €	5 341 €	11 170 €

Pour ce projet, le complément de financement prévu au budget initial, et les dépenses supplémentaires sont à la charge de Bilou Toguna.

Pour chacun des projets, les écarts entre les prévisions et les dépenses sont expliqués dans les § qui suivent.

Le surcoût entre budget et dépenses est le cas échéant entièrement financé par l'association Bilou Toguna sur ses fonds.

Ce document présente également la fin de la construction du **puits d'eau domestique de Djimini Goura**, prévu au budget 2023, qui a été achevé début 2025.

Barrage de NAMANDON

Le site de Namandon est sur le territoire du village de Kamba – Gandikilema, qui fait partie de la commune de Sangha, dans la région de Bandiagara (Pays Dogon – centre du MALI).

La construction du barrage s’est déroulée d’avril à juin 2024, et la vanne a été confectionnée et mise en place dans le pertuis central fin septembre, pour bénéficier des dernières pluies afin de remplir la retenue. Cette année 2024, la pluviométrie a été abondante, et la saison des pluies (habituellement juillet – septembre) s’est prolongée jusqu’en octobre.

Photos du site avant la construction :



Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023

Photos du déroulement de la construction :


Avril 2024- taille des pierres par les villageois , approvisionnement des matériaux pour la confection du béton



Avril 2024 - début de la construction du corps du barrage : parements amont et aval faisant office de coffrage, et remplissage avec du béton, renforcement de la stabilité avec des fers à béton ancrés dans la fondation.



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*

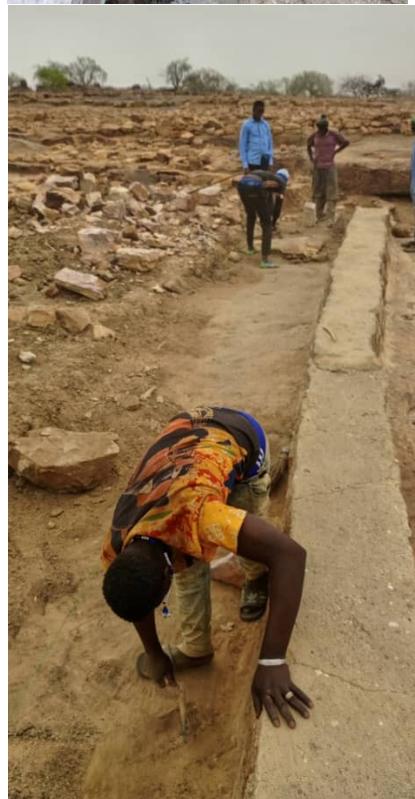

Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023



Juin 2024 - Construction terminée (parement amont, parement aval et contreforts)



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



**Août 2024 : A gauche - barrage pendant la saison des pluies (pas de vanne – déversement)
Octobre 2024 : A droite - barrage avec vanne posée (retenue d'eau à l'amont)**



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*

Octobre 2024 vanne posée, retenue en eau (cultures d'oignons sur les berges, culture de riz dans la retenue)



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



Bilan des dépenses pour le barrage de Namandon :

Date	Nature de la dépense	Montant (FCFA)	Montant (€)
04/04/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
09/04/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	1 400 000	2 134,15
10/04/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
26/04/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	350 000	533,54
06/05/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	1 300 000	1 981,70
10/06/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	200 000	304,88
04/07/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	300 000	457,32
16/08/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
23/09/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
11/10/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
24/10/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60

Total dépensé :

3 585 000 FCFA soit 5 465 €

Répartis comme suit :

3 555 000 FCFA versés au maçon (5 419 €)

30 000 FCFA de frais de déplacements pour suivi de l'avancement du chantier (45,70 €)

Au démarrage du chantier, les villageois ont versé une contribution de 150 000 fcfa (230 €) le 2 avril 2024.

Par rapport au budget prévu, un premier surcoût est lié à la confection de la vanne (dimensions plus importantes que ce qui était prévu). D'autre part, l'augmentation du prix unitaire du sac de ciment, du transport et de l'énergie explique également le dépassement.

Le surcoût final de 369 € est pris en charge pour partie par le versement des villageois, et par l'association Bilou Toguna.

Puits d'eau domestique pour le village de AMANI DJANOGO

La demande la construction d'un puits d'eau domestique (destiné à la consommation d'eau par la population) dans le village de Amani Djonogou (commune de Sangha – région de Bandiagara) a été transmise début 2023.

Ce nouveau puits doit remplacer celui qui existait auparavant mais qui s'était effondré en 2022. Il sera équipé d'une pompe manuelle « India » pour améliorer la potabilité de l'eau.

Le creusement du puits a démarré en avril, il était achevé en juillet 2024. La dalle de protection, la fermeture du puits et la mise en place de la pompe ont été terminées en janvier 2025. La pompe a été prise dans le stock sur place de l'association Bilou Toguna.

L'eau a été rencontrée à – 5 m.

La protection des parois a été réalisée par mise en place de buses préfabriquées.

La pompe manuelle (India) a été prise parmi les 2 pompes restant dans le stock de Bilou Toguna à Sangha

Avril – mai 2024 : démarrage de la construction



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



Août 2024 (saison des pluies) – creusement du puits achevé, reste à bâtir la zone de propreté, et à installer la tête du puits (dalle de protection et pompe)



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



Janvier 2025 – Dalle de protection coulée, protection tête du puits mise en place et pompe installée.



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*

Bilan des dépenses pour le puits d'eau domestique de AMANI DJANOGOU :

Date	Nature de la dépense	Montant (FCFA)	Montant (€)
03/02/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
24/06/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	1 000 000	1 524,50
18/05/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
04/07/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	300 000	457,35
15/08/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
01/12/2024	Installation de la pompe manuelle India	175 000	114,30
04/01/2025	Confection de la fermeture métallique du puits	45 000	68,60
27/01/2025	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60

Total dépensé :

1 540 000 FCFA soit 2 347,60 €

Répartis comme suit :

1 300 000 FCFA versés au maçon (1 982 €)

45 000 FCFA pour payer la fermeture métallique du puits (68,60 €)

175 000 FCFA pour l'installation de la pompe (266,80 €)

20 000 FCFA de frais de déplacements pour suivi de l'avancement du chantier (30,50 €)

Bilan : Pour ce puits, l'eau ayant été rencontrée plus tôt que prévu dans le devis, le creusement a été moins profond. Par ailleurs, la pompe manuelle a été prise sur le stock de Bilou Toguna, ce qui a réduit également la dépense.

Salle de classe pour l'école de Sangha A

La construction d'une 7^e salle de classe au sein de cette école a pour but de décongestionner le sureffectif de cette école, et de permettre aux enfants de suivre les cours plus correctement.

La représentante de Bilou Toguna pour le suivi des travaux est Nema Poudiougou.

La demande a été reçue par Bilou Toguna en février 2024. Etant donné l'urgence, Bilou Toguna a décidé de répondre favorablement à cette demande (construction du bâtiment), afin d'ouvrir la classe au plus vite.

La commune de Sangha et le CAP (représentants locaux de l'académie) se sont engagés à prendre à leur charge la fourniture du mobilier (tables-bancs pour les élèves, bureau de l'enseignant) et du matériel pédagogique. L'association des parents d'élèves, les enseignants et les jeunes de l'école se sont engagés à participer à la construction (tâches de manutention, repas des ouvriers).

Après examen de 3 devis, la construction a été confiée à EOT – BTP, un entrepreneur de Sévaré (Oumar Teme), sur la base d'un plan-type.

Les métrés ont été revus par Bilou Toguna en septembre 2024, et le devis final a été réajusté : par rapport au premier devis de 10 650 €, le prix a été évalué à 6 208 628 fcfa (soit 9 500 €).

Le bâtiment est ancré sur une semelle de 80x80, construite dans des fouilles (roches décaissées)

En cours de chantier, l'entrepreneur nous a transmis une demande d'avenant pour un montant de 905 865 fcfa, pour les surcoûts suivants, liés aux améliorations suivantes :

- Mise en place de bacaciers (peints en blanc) à la place des tôles ondulées qui étaient prévues sur la toiture (meilleure résistance, et qualités thermiques).
- Pose de profilés IPN pour la charpente de la toiture, à la place des poutres bois prévues initialement.

Ce qui porte le **montant final du devis à 7 114 437 fcfa (10 845 €)**, proche du montant initial

Une cérémonie officielle de démarrage du chantier s'est tenue en présence des représentants locaux de Bilou Toguna, de l'entrepreneur, du directeur et des enseignants de l'école, et avec les officiels impliqués par le projet (maire, chef du village, représentant du CAP,...)

Un PV de cette réunion a été reçu

La construction a démarré début novembre 2024, la salle de classe était achevée fin janvier 2025.

Une cérémonie de réception officielle et d'inauguration de la salle de classe s'est tenue le 19 février 2025. Le document de réception, et des photos de cette cérémonie sont également présentés dans ce document.

REGION DE BANDIAGARA

COMMUNE RURALE DE SANGHA

 Email : mairie.sangha_paysdogon@yahoo.com
 Tel : (+223) 66 79 00 65 / 76 02 10 26



REPUBLIQUE DU MALI
 Un Peuple - Un But - Une Foi

Sangha, le 13 Novembre 2024

Procès verbal de mise en disposition du terrain
d'une classe sur financement de Biclou-Toguna

L'an deux mille vingt quatre et le 13 novembre, c'est tenue dans la cour du groupe scolaire « **Ingre DOLO** » une rencontre pour le choix et attribution d'un espace qui doit abriter une salle de classe sur financement de Bilou-Toguna au compte de la population de sangha.

Étaient présent : la mairie, le CAP, les deux CGS, les deux directeurs du groupe scolaire, le technicien de l'entreprise **EOT**, les chefs villages de Sangha, la représentante de Bilou-Toguna et le personnel enseignant du groupe Scolaire.

A l'unanimité nous avons choisi le site qui doit abriter la salle de classe.
 Après sur de bonnes notes de remerciement, de reconnaissance et de félicitation de notre partenaire Bilou-Toguna et de **Nema POUDIOUGO** qui a fait la demande. nous avons levé la séance.

Ont Signés :

Structure	Nom Prénom	signature
Mairie	Ali Inogo DOLO (Maire)	
CAP	Atti GUINDO (CO)	
Directeur A	Amassomou DOLO	
Directrice B	Awa DOUYON	
CGS A	Akouni DOLO	
CGS B	Drissa A DOLO	
Chef village Sangha Ogol-Leye	Ana D DOLO	
Chef village Sangha Ogol-Da	Dissa K DOLO	
Chef village Sangha Barou	Somine DOLO	
Chef village Sangha Dini	Ingre DOLO	
Représentante de Bilou-Toguna	Nema POUDIOUGO	
Représentant de l'entreprise EOT	Bourema A DOLO	



Le Maire,

Ali Inogo DOLO
 Médaille du Mérite National

*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



13 novembre 2024 - réunion officielle de démarrage du chantier



Nema Poudiogo, représentante de Bilou Toguna

Confection des parpaings



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*

Pose de la 1e pierre :



Approvisionnement des matériaux :



Déroulement de la construction :



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



Cérémonie d'inauguration de la salle de classe :



*Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023*



Premier cours dans la salle de classe (février 2025) – remerciements de la part des élèves :



Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023



Bilou Toguna
25, Rue Henri Martin
31700 BLAGNAC
association@biloutoguna.org
www.biloutoguna.org

Année 2025

Bordereau de Réception de Travaux et de mise à disposition de l'ouvrage aux utilisateurs bénéficiaires.

Je soussigné, **Jean-François GAUSSENS**, président de l'association **BILOU TOGUNA**, certifie remettre ce jour, une salle de Classe sur le site dénommé « Ecole premier cycle de Sangha A »,

par l'intermédiaire de Nema Poudiougo et Ogobara Dolo représentants de Bilou Toguna à Sangha .

Au village de Sangha et à sa municipalité représentée par son maire Ali Dolo en présence de l'entreprise Oumar Témé BTP qui a réalisée le bâtiment.

Nous déclarons l'ouvrage entièrement terminé et conforme à l'utilisation.

En retour, le village de Sangha, par l'intermédiaire de la Mairie, du C.A.P et du directeur de l'école, s'engage à l'utiliser, le gérer et à l'entretenir grâce au comité de gestion mis en place ce jour.

Un rapport annuel d'utilisation sera adressé à Bilou Toguna 1 fois par an.

Fait à Blagnac/Sangha en 2 exemplaires,

Le 19-2-2025.

Pour BILOU TOGUNA,

Pour le village de Sangha

pour l'entreprise O T BTP

~~Assoc. JF GausSENS Toguna
25, rue Henri Martin
31700 BLAGNAC
association@biloutoguna.org
www.biloutoguna.org~~

Ogobara Dolo

Nema Poudiougo

Le maire Ali Dolo

Le CAP de Sangha

Le directeur de l'école

Oumar Teme

Association Loi 1901 à but non lucratif
Inscrite en Préfecture de Haute Garonne sous le N° 3/3339
N° JO: 20020037
SIREN 520 437 120 - SIRET 520 437 120 0001

Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023

Bilan des dépenses pour la salle de classe de Sangha A :

Date	Nature de la dépense	Montant (FCFA)	Montant (€)
11/2024	Versement à Oumar Teme	3 175 488	4 841
01/2025	Versement à Oumar Teme	3 514 042	5 357
02/2025	Versement à Oumar Teme (solde suite à réception chantier)	636 246	970

Total dépensé :

7 325 776 Fcfa (11 170 €)

Bilan :

Par rapport au budget prévu, le surcoût est dû à l'utilisation de matériaux de meilleure qualité que ce qui avait été envisagé, en particulier pour la confection de la toiture.

Bilou Toguna considère que ce chantier est une réussite, avec un entrepreneur (Oumar Teme) que nous ne connaissions pas, et qui s'est avéré très réactif et d'une grande efficacité. L'avancement du chantier s'est déroulé en confiance.

A noter également l'implication de nos correspondants locaux, en particulier Nema Poudiogo, qui s'est assurée du bon déroulement des travaux, et de l'implication des responsables locaux qui ont fourni le mobilier et équipements de la classe.

Grace à l'ensemble de ces acteurs, les premiers cours se sont tenus en février 2025, ce qui est bien plus tôt que l'objectif initial qui était septembre 2025 !

Puits d'eau maraîcher pour le village de DJAMINI GOURA (achèvement d'un projet 2023)

Le village de Djamini Goura est situé sur le plateau Dogon (commune de Sangha – région de Bandiagara)

Rappel :

Une première tentative de creusement du puits a démarré en juillet 2023. A l'emplacement initialement prévu, le rocher dur a été très rapidement rencontré (voir photo ci-dessous). Il a été décidé de s'écarter de cette zone pour un nouveau creusement.

Mi-novembre 2023, 5,50 m ont été creusés manuellement. L'eau est arrivée entre -5,50 m et -6 m. Pour arriver à la profondeur prévue (- 9 m), il était nécessaire de poursuivre avec de l'explosif, ce qui est compliqué dans le contexte sécuritaire actuel. Le creusement et l'équipement de protection de la tête du puits ont été terminés fin 2024.

Construction de la tête du puits :



Puits terminé et équipé :



Fondation Engagés Solidaires - Association Bilou Toguna :
Bilan définitif des projets 2024 au MALI – fin des projets 2023

Puits terminé et équipé

Bilan des dépenses pour le puits de DJAMINI GOURA :

Date	Nature de la dépense	Montant (FCFA)	Montant (€)
02/07/2023	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
03/07/2023	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	23 884	
13/07/2023	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	200 000	
18/07/2023	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	450 000	
29/07/2023	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	200 000	
20/08/2023	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
20/08/2023	Confection de la fermeture du puits	90 000	137,20
26/08/2023	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	500 000	
30/08/2023	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
31/05/2023	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	300 000	
18/09/2023	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
24/09/2023	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	100 000	
01/10/2023	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
18/10/2023	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	100 000	
03/11/2023	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	400 000	
21/11/2023	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
09/01/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
19/02/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	200 000	
19/03/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	200 000	
20/04/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
10/06/2024	Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE)	200 000	
01/09/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
07/12/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60
10/12/2024	Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO)	5 000	7,60

Total dépensé :

3 208 884 FCFA soit 4 892 €

Répartis comme suit :

2 973 884 FCFA versés au maçon (4 533 €)

90 000 FCFA pour payer la fermeture métallique du puits (137,20 €)

145 000 FCFA de frais de déplacements pour suivi de l'avancement du chantier (221 €)

La pompe manuelle a été prise sur le stock de Bilou Toguna

Bilan : en raison des difficultés de creusement dans la roche, ce puits aura coûté très cher. Le surcoût (3 092 €) est entièrement pris en charge sur les fonds de Bilou Toguna.
